


UM- UND NEUBAU KONZERNHAUPTSITZ

Newsletter 01 - November 2016

Start der Rückbauarbeiten

Die Vorarbeiten für die Um- und Neubauarbeiten des Zürich Konzernhauptssitzes haben im August 2016 begonnen. Ab dem 28. November 2016 starten die Rückbauarbeiten. Drei Gebäude (1000, 2000 und 7000) sind im Inventar der kunst- und kultur-

historischen Schutzobjekte eingetragen. Sie werden saniert und bleiben erhalten. Die übrigen Bauten an der Alfred-Escher- und Breitingenstrasse (blau markiert) werden abgebrochen. Die Rückbauarbeiten dauern bis Ende April 2017.

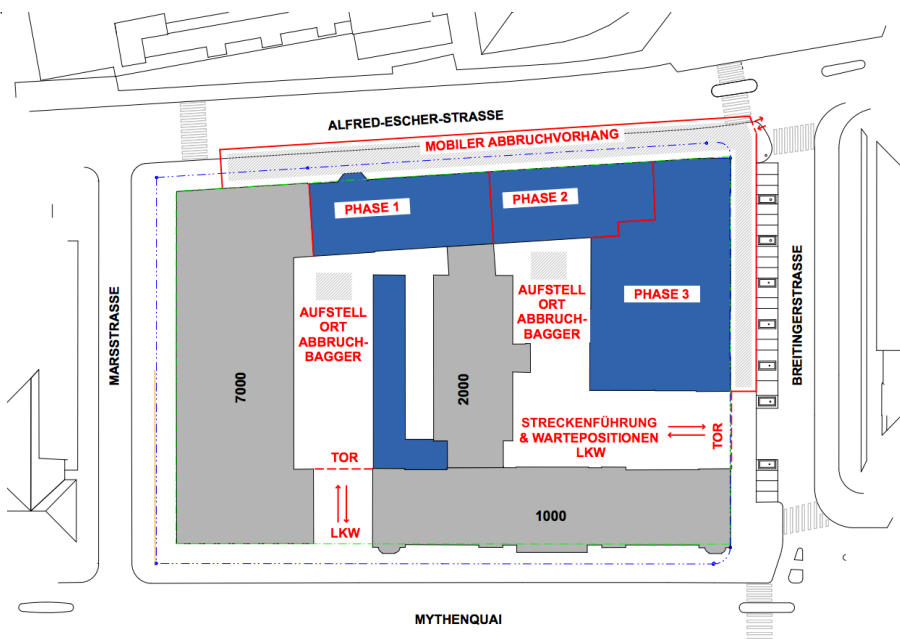

Der alte Hauptsitz am Mythenquai (Gebäude 1000), sowie die bestehenden Gebäude 2000 und 7000 werden wieder auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt.



Bauarbeiten	Dauer	Emissionen	Intensität	2016		2017			
				Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr
Bauwand montieren	7.11. - 16.11.2016	Geringe Lärmemissionen	gering	■					
Installation / Vorbereitung Rückbauarbeiten	16.11. - 25.11.2016	Mässige Lärmemissionen	mässig	■					
Rückbau Phase 1	28.11. - 23.12.2016	Lärmemissionen durch Abbrucharbeiten und LKW Transporte	hoch		■				
Arbeitsunterbruch Feiertage	24.12.2016 - 2.1.2017								
Rückbau Phase 2	3.1. - 31.1.2017	Lärmemissionen durch Abbrucharbeiten und LKW Transporte	hoch			■			
Rückbau Phase 3	3.2. - 31.3.2017	Lärmemissionen durch Abbrucharbeiten und LKW Transporte	hoch				■	■	
Fertigstellungsarbeiten	3.4. - 28.4.2017	Mässige Lärmemissionen durch Baumaschinen und LKW Transporte	mässig						■

Emissionsstärke:

gering mässig hoch

Arbeitszeiten Mo-Fr zwischen 7.00 – 12.00 und 13.00 – 19.00 (Samstagsarbeit möglich)
Die Situation auf der Baustelle kann zu kurzfristigen Änderungen im Zeitplan führen.
Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

Ansprechpartner für Fragen und Anliegen zum Bauprojekt:

IMBACH Baukommunikation Herbert Imbach imbach@bau-kom.ch 044 533 55 05

ARCHITEKT

KRISCHANITZ

h+p
